

2026 年 5 月 20 日 Version 1.0

ハッカソン ～計画書と設計書～

チーム 23

24G1038 : 片岡 聖

24G1175 : 地曳 賢人

24G1131 : 御代川 稜

25G1021 : 梅澤 颯太

25G1053 : 齋藤 翔太

25G1065 : 塩澤 匠生

目次

第 1 章	プロジェクトの計画書	1
1.1	プロジェクトの概要	1
1.1.1	プロジェクトの題目	1
1.1.2	プロジェクトの目的	1
1.1.3	既存の技術とプロジェクトの独自性	2
1.2	スコープ・マネジメント	2
1.2.1	成果物	2
1.2.2	プロジェクトの対象範囲と非対象範囲	3
1.2.3	機能分解構造 FBS	3
1.2.4	製品分解構造 PBS	4
1.2.5	FBS と PBS の対応関係	4
1.3	作業計画	5
1.3.1	作業分解構造 WBS と管理番号	5
1.3.2	アローダイアグラムとクリティカルパス	6
1.3.3	役割分担	7
1.3.4	ガントチャート	7
1.4	検証と妥当性確認: V&V 計画	8
1.4.1	プロジェクトの成果物に対する有効指標 MOE	8
1.4.2	有効指標 MOE に対応する性能指標 MOP	9
1.4.3	システムテストで評価する性能指標 MOP	9
1.4.4	結合テストで評価する性能指標 MOP	10
1.4.5	単体テストで評価する性能指標 MOP	10
1.4.6	プロジェクト中に監視する技術性能指標 TPM	10
1.4.7	プロジェクト中に監視する指標 TPM	10
1.5	資源・調達管理	11
1.6	リスク管理	11
第 2 章	システムの基本設計	13

2.1	機能一覧	13
2.2	システム構成図	13
2.3	操作インターフェース設計	13
2.4	状態遷移図	13
第 3 章	システムの詳細設計	15
3.1	部品一覧	15
3.2	ハードウェア設計	15
3.3	ソフトウェア設計	15
3.3.1	ファイル構成	15
3.3.2	オブジェクト設計 (クラス図)	15
3.3.3	関数設計	15
3.4	処理フローの設計	15
3.5	テストの設計	15
第 4 章	生成 AI の利用	17

第 1 章 プロジェクトの計画書

本章では、本プロジェクトの概要・スコープ・作業計画・検証方針・資源・リスクを示す。本プロジェクトは約 13 週間をかけ、ハードウェア（Arduino）とソフトウェア（Processing）を組み合わせた電子オーケストラを構築するものである。チーム 23 では、指揮動作によって楽曲のテンポと音量を変化させられる演奏システムを開発する。

1.1 プロジェクトの概要

1.1.1 プロジェクトの題目

本プロジェクトの題目は「指揮用 Arduino から指揮をするオーケストラ」である。指揮者が手に持つ Arduino の動きを起点として、複数の楽器ノードと PC アプリが同期して合奏する、体験型の電子オーケストラを指す。

1.1.2 プロジェクトの目的

本プロジェクトの目的は、時間帯・天候・通信環境などの外部条件や明るさの制約に左右されず、音楽経験のない人でも直感的な指揮動作だけで演奏に参加できるシステムを開発することである。具体的には、指揮棒を振る周期を検出して楽曲のテンポへ反映し、加速度の大きさに応じた音量変化や LED による視覚的演出を加えることで、誰でも楽しめる体験型電子オーケストラの実現を目指す。最終的なゴールは、指揮棒を振った際に、振りの大きさや周期の速さに応じて音楽の音量とテンポが変化する状態を達成することである。

本目的の達成には、次の課題を解決する必要がある。

- ・ **指揮動作の安定検出**：指揮棒の振りには個人差があり、速さ・大きさ・角度が異なる。どのような振り方でも安定して動作を検出する必要がある。

- ・ **テンポへのリアルタイム反映**：指揮棒を振った周期に合わせ、遅延なく自然にテンポを変化させる必要がある。反応が遅いと操作感が損なわれる。
- ・ **誤検出の抑制**：小さな揺れや不要な動きを指揮動作と誤認するとテンポが乱れるため、必要な動作だけを判定する仕組みが要る。
- ・ **未経験者でも使える操作性**：専門知識がなくても直感的に扱えるよう、簡単な操作方法と分かりやすいフィードバックを用意する。
- ・ **演奏状態の可視化**：現在のテンポや音量変化が伝わりにくいと操作しづらいため、LED 表示などで演奏状態を可視化する。
- ・ **環境条件への非依存**：明るさ・時間帯・天候・通信環境に依存せず、屋内外で安定して使用できる構成とする。

1.1.3 既存の技術とプロジェクトの独自性

既存技術として、テルミンのような非接触型電子楽器や、カメラ・センサを用いて身体動作を音楽表現へ変換するシステムが存在する [1]。また、Wii Music[2] では、コントローラの動作から拍を検出して音楽のテンポを制御している。しかし、これらの多くは高い演奏技術を要したり、明暗などの環境条件に影響を受けやすい。さらに、1 台の機器内で音源生成を完結させる構成が多く、複数端末による分散演奏や、身体動作によるリアルタイムな指揮制御には十分対応していない。以上より、複数マイコンによる分散演奏と、身体動作によるリアルタイム指揮制御を両立する点に、本プロジェクトの新規性がある。

1.2 スコープ・マネジメント

1.2.1 成果物

本プロジェクトの成果物を以下に示す。

- ・ オーケストラ実機一式（指揮者ノード 1 台＋楽器ノード 4 台）
- ・ 4 種類の音色を生成・合成する Processing プログラム
- ・ システム構成図および設計書一式
- ・ 動作確認結果および性能評価資料
- ・ プロジェクト計画書および最終報告書

1.2.2 プロジェクトの対象範囲と非対象範囲

本プロジェクトの対象範囲を以下に示す。

- ・ Arduino を用いた指揮動作検出システムの開発
- ・ 加速度センサによる指揮棒の振り動作の取得
- ・ 振り周期に応じた楽曲テンポの制御機能
- ・ 振りのエッジ検出によるテンポ変化機能
- ・ 振り速度に応じた音量変化機能
- ・ ハードウェアとソフトウェアを統合したシステム構築
- ・ システムの動作確認および性能評価

一方、以下の内容は対象外とする。

- ・ プロのオーケストラに匹敵する高精度な指揮解析
- ・ AI を用いた自動指揮認識機能
- ・ 複数人による同時指揮への対応
- ・ 市販音楽制作ソフトウェアとの連携
- ・ 楽曲の自動生成機能、および複雑なジェスチャ認識機能

1.2.3 機能分解構造 FBS

本システムが実現すべき機能を階層的に整理した機能分解構造（FBS）を図 1.1 に示す。最上位の「Arduino オーケストラ」を、指揮解析・同期通信・楽譜進行・音響合成の 4 つの機能群へ分解した。指揮解析は指揮動作の認識から演奏速度の決定・開始停止・表情抽出までを担い、同期通信は共通時刻の共有・指示の一斉配信・通信の安定性確保を担う。楽譜進行はテンポ追従再生・パート別演奏制御・発音タイミング管理を、音響合成は金管楽器音の再現・多重音の発音・演奏状態の可視化を担う。

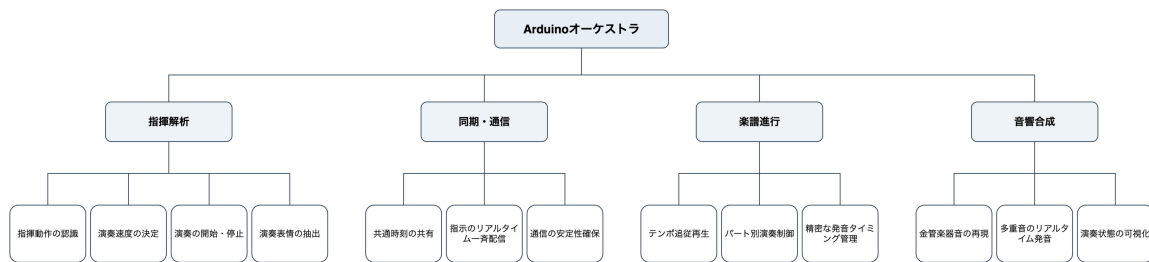


図 1.1 機能分解構造 (FBS)

1.2.4 製品分解構造 PBS

FBS の各機能を実現するために必要な成果物を整理した製品分解構造 (PBS) を図 1.2 に示す。システムを、指揮者ノードユニット・ネットワーク基盤・楽器演奏ユニット・音響合成アプリケーションの 4 系統へ分解した。指揮者ノードユニットは指揮者用 Arduino と動作解析ファームウェア・コマンド送出モジュールから成り、ネットワーク基盤は全ノードで共有する通信モジュール・共通定義ファイル・API フレームワークから成る。楽器演奏ユニットは楽器用 Arduino と演奏進行エンジン・楽譜データアセットを、音響合成アプリケーションは Processing 音響合成エンジン・ボイスマネージャー・演奏モニタ UI を含む。

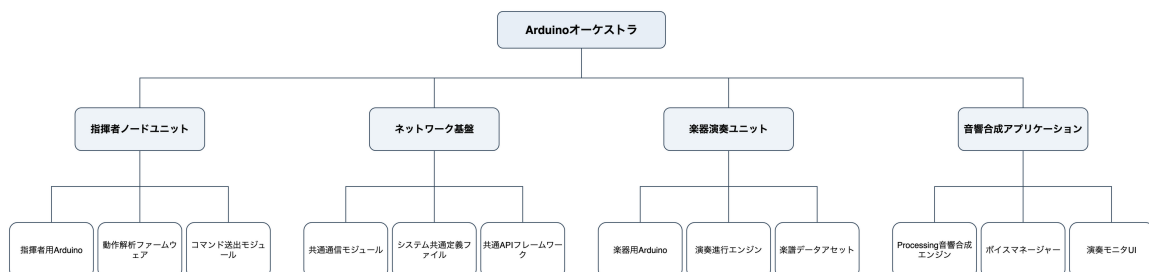


図 1.2 製品分解構造 (PBS)

1.2.5 FBS と PBS の対応関係

FBS はシステムが実現する「機能」を、PBS はそれを実現する「成果物・構成要素」を表す。両者の主な対応関係を表 1.1 に示す。FBS で定義した各機能群は、PBS のいずれかの成果物系統によって実現される構成となっている。

表 1.1 FBS と PBS の対応関係

FBS（機能群）	対応する PBS（成果物系統）
指揮解析	指揮者ノードユニット（指揮者用 Arduino, 動作解析ファームウェア, コマンド送出モジュール）
同期・通信	ネットワーク基盤（共通通信モジュール, システム共通定義ファイル, 共通 API フレームワーク）
楽譜進行	楽器演奏ユニット（楽器用 Arduino, 演奏進行エンジン, 楽譜データアセット）
音響合成	音響合成アプリケーション（Processing 音響合成エンジン, ボイスマネージャー, 演奏モニタ UI）

1.3 作業計画

1.3.1 作業分解構造 WBS と管理番号

本プロジェクトの作業を，設計・製造・テスト・ストレッチ・運用発表の 5 つのフェーズに分け，要素成果物ごとに管理番号を付して整理した。作業分解構造（WBS）を表 1.2 に示す。番号は，フェーズ（100 番台～500 番台）と要素成果物（下 2 桁）の体系で付与している。

表 1.2 作業分解構造 (WBS)

番号	要素成果物	主なタスク	担当
100 設計フェーズ (工数目安 3 週間)			
110	基本設計	FBS / PBS / MOE・MOP・TPM の最終化, システムアーキテクチャ・通信プロトコル・楽譜データ形式・音色合成の基本設計	全員, 塩澤, 齋藤, 梅澤
120	詳細設計	共通層 API・指揮者・楽器の詳細設計, Processing 詳細設計, 周波数分析, 楽譜データ詳細設計	塩澤, 梅澤, 齋藤
200 製造フェーズ (工数目安 2 週間)			
210	共通層実装	IModule / ModuleTimer 実装, SystemData / ProjectConfig 整備, OrcNetModule 実装	塩澤
220	指揮者ノード	IMU ドライバ, 信号前処理, 拍検出, テンポ推定, コマンド送の各モジュール実装	塩澤
230	楽器ノード	CTRL / BEAT 受信, 楽譜進行ロジック, NOTE 送, パート別差分適用の実装	塩澤
240	楽譜準備	課題曲 4 パートの選定, 楽譜ヘッダの配列化, ROM 埋め込み確認	齋藤
250	Processing 実装	NOTE 受信, 音色合成エンジン, 4 パート同時発音管理, UI / モード表示	梅澤
300 テストフェーズ (工数目安 2 週間)			
310	単体テスト	共通層・拍検出・楽譜進行・音色生成の単体動作確認	塩澤, 梅澤
320	結合テスト	指揮者単体デモ, 指揮者・楽器結合, 4 ノード同期誤差計測, 全ノード結合	塩澤, 全員
330	システムテスト	拍検出精度, 通信遅延, 同期誤差, テンポ追従, パケットロス耐性, CPU 負荷, 起動時間	塩澤, 全員
400 ストレッチフェーズ (余裕がある場合)			
410	強弱推定	velocity 推定アルゴリズム実装, CTRL パケットへの乗せこみ, 強弱制御テスト	塩澤
500 運用・発表フェーズ			
510	発表	発表準備・デモ調整	全員
520	報告書	成果報告書 (個人) の作成	全員

1.3.2 アローダイアグラムとクリティカルパス

WBS の要素成果物間の先行関係をアローダイアグラムとして図 1.3 に示す。クリティカルパスは「110 基本設計 → 120 詳細設計 → 210 共通層実装 → 220 指揮者ノード → 230 楽器ノード → 310/320 テスト → 330 システムテスト → 510 発表

準備」で、全長は約 8 週間である。240 楽譜準備と 250Processing 実装は、120 詳細設計の完了後にクリティカルパスと並行して進められ、それぞれ 0.5～1.0 週のフロート（余裕）を持つため、多少の遅延を吸収できる。




図 1.3 アローダイアグラムとクリティカルパス

1.3.3 役割分担

チーム 23 は 6 名で構成される。役割分担を表 1.3 に示す。Arduino 系プログラム（指揮者・楽器・共通層）は、モジュール境界をそろえる目的で塩澤が一括して設計・実装する。楽譜データは齋藤，Processing による音色合成は梅澤が担当し，御代川・地曳・片岡は議事録・計画書編纂・調達を担う。テストフェーズ以降の実機検証および発表準備には全員が合流する。

表 1.3 チーム 23 の役割分担

メンバー	学籍番号	主な担当
塩澤 匠生	25G1065	Arduino 系プログラム全般（指揮者・楽器・共通層の設計・実装）
齋藤 翔太	25G1053	楽譜データ作成・音階生成ロジック・周波数分析
梅澤 颯太	25G1021	Processing による音色合成・演奏再生・UI
御代川 稜	24G1131	議事録（持ち回り 1 番手），計画書編纂
地曳 賢人	24G1175	議事録（2 番手），スケジュール管理
片岡 聖	24G1038	議事録（3 番手），WBS・役割整理，機材調達

1.3.4 ガントチャート

WBS と授業日程に基づくガントチャートを図 1.4 に示す。設計フェーズ（4 月下旬～5 月）で FBS・PBS・MOE/MOP/TPM の最終化と基本・詳細設計を行い，製造フェーズ（5 月下旬～6 月中旬）で共通層・指揮者・楽器・楽譜・Processing

の実装を並行して進める。テストフェーズ（6 月下旬）で単体・結合・システムテストを段階的に実施し、余裕があればストレッチとして強弱推定を追加する。運用・発表フェーズ（7 月）で成果発表会と成果報告書の作成を行う。240 楽譜準備と 250Processing 実装に余裕時間を持たせ、クリティカルパスの遅延を並列タスクで吸収できる構成とした。

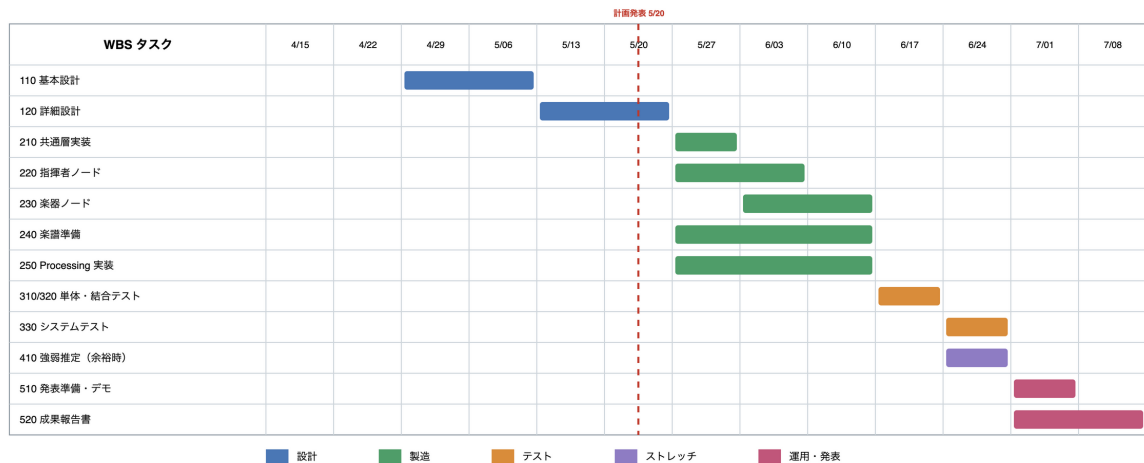


図 1.4 ガントチャート（WBS と授業日程の対応）

1.4 検証と妥当性確認: V&V 計画

1.4.1 プロジェクトの成果物に対する有効指標 MOE

有効指標（MOE：Measure of Effectiveness）は、システムが最終的にユーザー（指揮者・聴衆）へ提供する価値を評価する指標である。本プロジェクトでは 3 つの MOE を定め、各テスト階層の性能指標（MOP）の達成を通じて有効性を確立する。MOE と MOP の対応関係および目標値を表 1.4 に示す。

表 1.4 MOE と MOP の対応関係および目標値

性能指標 (MOP)	目標値
MOE 1：音楽的再現性と正確性（単体テスト領域）	
拍検出の正確性	正解率 $\geq 90\%$
音階の誤差	平均 $\leq 5.52 \text{ cent}$
楽譜との相違	誤ノート発音数 0
MOE 2：合奏の一体感とインタラクティブ性（結合テスト領域）	
楽器間同期誤差	$\leq 20 \text{ ms}$
指揮から楽器への通信遅延	$\leq 30 \text{ ms}$
テンポ追従の遅延	$\leq 2 \text{ 拍}$
MOE 3：システムの堅牢性と実用性（システムテスト領域）	
起動時間	$\leq 5 \text{ s}$
CPU 負荷（入力フェーズ）	$\leq 2 \text{ ms}$
パケットロス耐性	演奏継続が可能なレベル

1.4.2 有効指標 MOE に対応する性能指標 MOP

前項の各 MOE に対し，システム全体として達成すべき性能指標を次の通り定める。これらは特定の検証フェーズに限定されず，成果物が最終的に備えるべき技術的到達基準である。

- ・ **音楽的品質の達成基準**：指揮動作から拍を正確に解析し，楽譜データを正確なピッチで音響へ変換する精度を主軸に評価する。
- ・ **リアルタイム・アンサンブルの達成基準**：分散配置した複数ノード間の極小な同期誤差と，テンポ変化への停滞のない追従性能を主軸に評価する。
- ・ **運用プラットフォームの達成基準**：限られた計算資源内での処理完結，無線環境下での通信断耐性，即時稼働を可能にする運用性を主軸に評価する。

1.4.3 システムテストで評価する性能指標 MOP

システムテストでは，パケットロス耐性と CPU 負荷を評価する。パケットロスは，聴感上の破綻が生じない 5%以内を許容範囲の指標とする。CPU 負荷は，入力フェーズの処理時間を制御周期内に収めるため，2 ms 以内を指標とする。

1.4.4 結合テストで評価する性能指標 MOP

結合テストでは、ノード間の同期と遅延を評価する。20 ms を超えるずれがあると 2 つの音を別々の発音として知覚するため、楽器間の同期誤差は 20 ms 以内を指標とする [3]。指揮棒から楽器への通信遅延は 30 ms 以内、テンポ追従の遅延は 2 拍以内を指標とする。

1.4.5 単体テストで評価する性能指標 MOP

単体テストでは、拍検出と音階解析の精度を評価する。拍検出の正確性は 90%以上を指標とする。音階の誤差は、自己相関による音階解析で平均 5.52 cent であったことを踏まえ、5.52 cent までの誤差を指標とする [6]。

1.4.6 プロジェクト中に監視する技術性能指標 TPM

開発期間中、各性能指標の達成見込みを継続的に評価するための技術性能指標 (TPM) として次を監視し、技術的リスクを早期に発見する。

- ・ **同期誤差の推移**：目標値 20 ms に対する到達度を監視する。通信プロトコルの最適化やノード数の増減が生じた際に実測し、目標値からの乖離が 10 ms 以上となった場合はバッファ制御を再検討する。
- ・ **CPU 処理時間のマージン**：制御周期 5 ms に対する各タスクの処理時間を監視する。CPU 負荷が目標値 (2 ms) の 80%を超えた段階で、コード最適化とタスク優先順位の再設計を行う。

1.4.7 プロジェクト中に監視する指標 TPM

技術的な数値指標に加え、プロジェクト全体の進捗と資源の健全性を維持するため次を監視する。

- ・ **機能実装の完了率**：WBS に基づく各モジュールの実装進捗を監視する。指揮解析と通信基盤の統合が遅延した場合は、クリティカルパス上のリスクとして要員配置やスコープの調整を行う。
- ・ **システム稼働の安定度**：連続稼働テストにおける意図しないリセットやハングアップの発生頻度を監視し、不安定要素やメモリリークを早期に排除する。

1.5 資源・調達管理

本プロジェクトの遂行に必要となるハードウェア資源および開発環境の調達計画を次に示す。

- ・ **ハードウェア資源**：指揮者用 1 台・楽器用 4 台の計 5 台の Arduino を使用する。指揮解析用の IMU センサおよび各楽器ノードの出力デバイスは、チーム内の既存資産と新規調達によって確保済みである。
- ・ **開発・運用リソース**：ソースコード管理に Git を用い、チーム内の並行開発を可能とする。無線通信の検証用に専用ルーターを用い、会場等の外部環境に依存しない安定した通信経路を確保する。

1.6 リスク管理

各担当箇所の作業日数を長めに見積もり、バッファを設けることで、体調不良や不具合により作業が滞った場合でも、スケジュール通りへの修正を容易にする。特に、クリティカルパス上でない 240 楽譜準備・250Processing 実装に余裕時間を持たせ、クリティカルパスに遅延が生じても並列タスクで吸収できる構成とした。進捗の遅れは前項の TPM（機能実装の完了率）で早期に検知し、要員配置やスコープの調整で対応する。

第 2 章 システムの基本設計

2.1 機能一覧

2.2 システム構成図

2.3 操作インターフェース設計

2.4 状態遷移図

第 3 章 システムの詳細設計

3.1 部品一覧

3.2 ハードウェア設計

3.3 ソフトウェア設計

3.3.1 ファイル構成

3.3.2 オブジェクト設計 (クラス図)

3.3.3 関数設計

3.4 処理フローの設計

3.5 テストの設計

参考文献

- [1] 川合雄佑, 伊藤彰教, 「非接触型電子楽器の開発を通じたサウンドデザイン」, 東京工科大学メディア学部, 先端芸術音楽創作学会会報, Vol. 14, No. 1, pp. 14-19, 2022.

- [2] 任天堂株式会社, 「Wii Music 公式サイト」, <https://www.nintendo.co.jp/wii/r64j/index.html>, 2008 (2026-04-28 閲覧) .
- [3] Álvaro Barbosa, “Displaced Soundscapes: A Survey of Network Systems for Music and Sonic Art Creation,” *Leonardo Music Journal*, Vol. 13, pp. 53–59, 2003.
- [4] 久松剛, 「分散環境におけるフィードバックを用いたオーケストラ演奏機構の構築」, 慶應義塾大学 環境情報学部 卒業論文, 2003.
- [5] 中村栄太, 武田晴登, 山本龍一, 齋藤康之, 酒向慎司, 嵯峨山茂樹, 「任意箇所への弾き直し・弾き飛ばしを含む演奏に追従可能な楽譜追跡と自動伴奏」, 情報処理学会論文誌, Vol. 54, No. 4, pp. 1338–1349, 2013.
- [6] 竹内英世, 梅崎太造, 保黒政大, 「カラオケ採点用の高分解能ピッチ抽出法」, 電気学会論文誌 C, Vol. 129, No. 10, pp. 1889–1901, 2009.

第 4 章 生成 AI の利用
