

ハッカソン2

～プロジェクトの実行～

関根 晃太・白木 詩乃




プロジェクトの実行と終結

▶ Grammar

▶ Example

▶ Solution

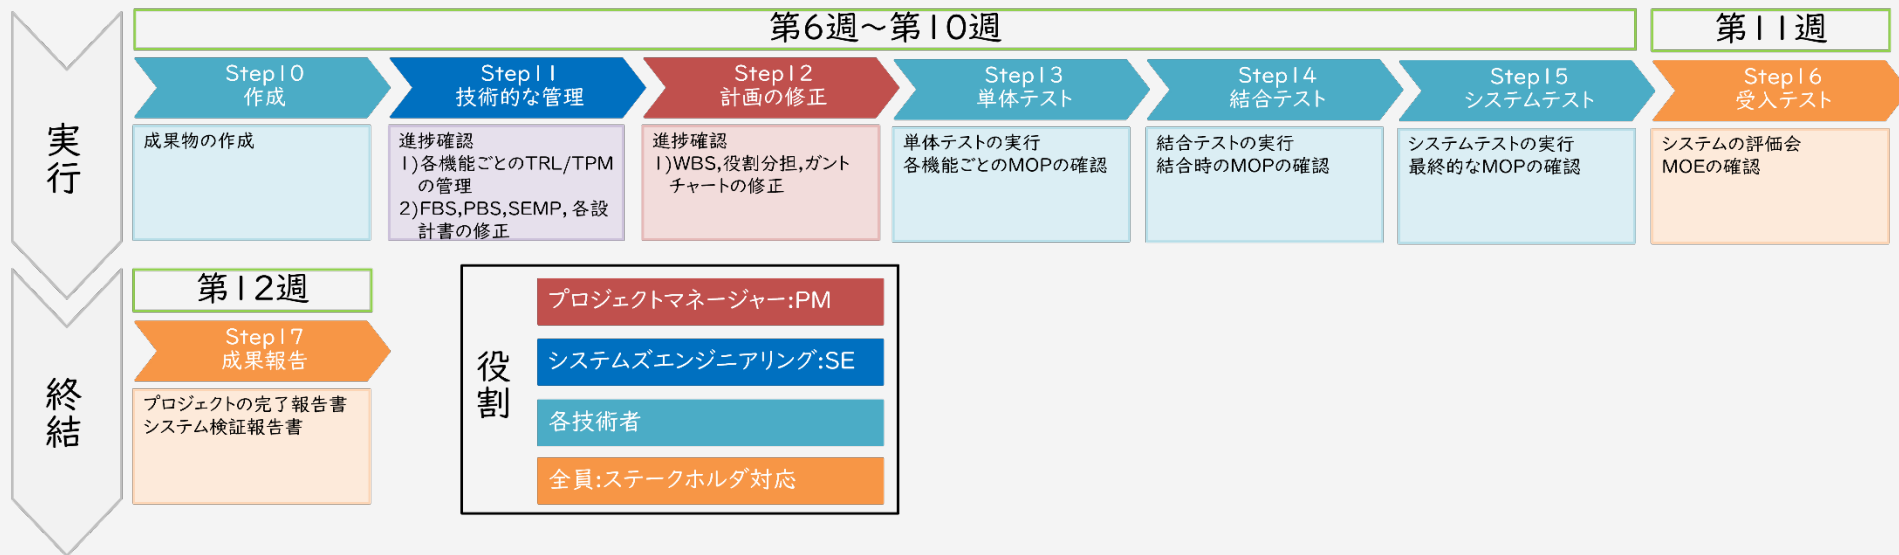


プロジェクトの実行と終結

▶ Grammar

▶ Example

▶ Solution

1. プロジェクトを実行・管理!(毎週: 進捗報告 → 議論 → データ化, 修正, 報告)

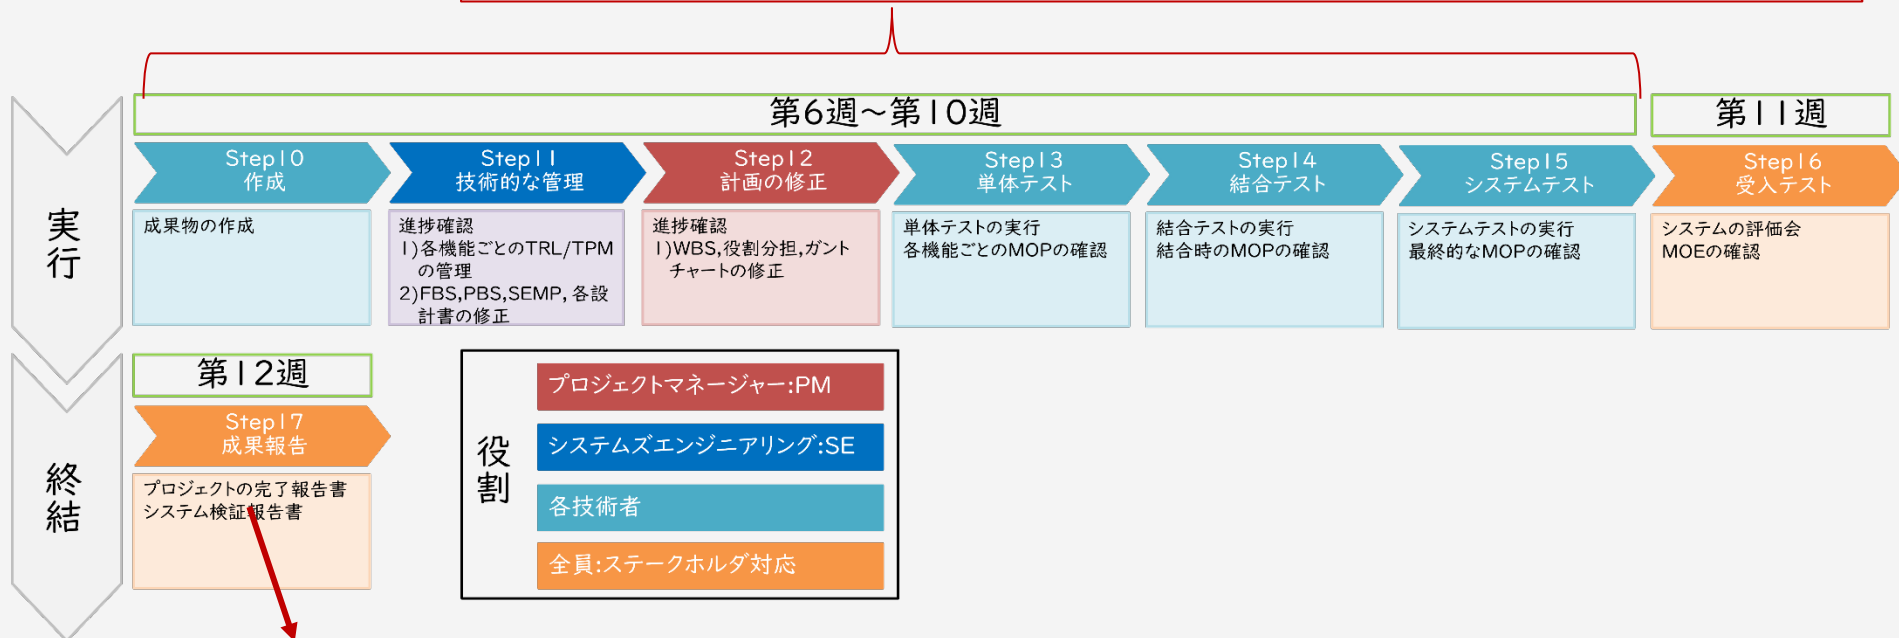

2. プロジェクトを管理した結果について報告書で提出!
※ 作成したシステムの技術的な報告書ではない!!


プロジェクトの実行と終結

▶ Grammar

▶ Example

▶ Solution

1. プロジェクトを実行・管理!(毎週: 進捗報告 → 議論 → データ化, 修正, 報告)

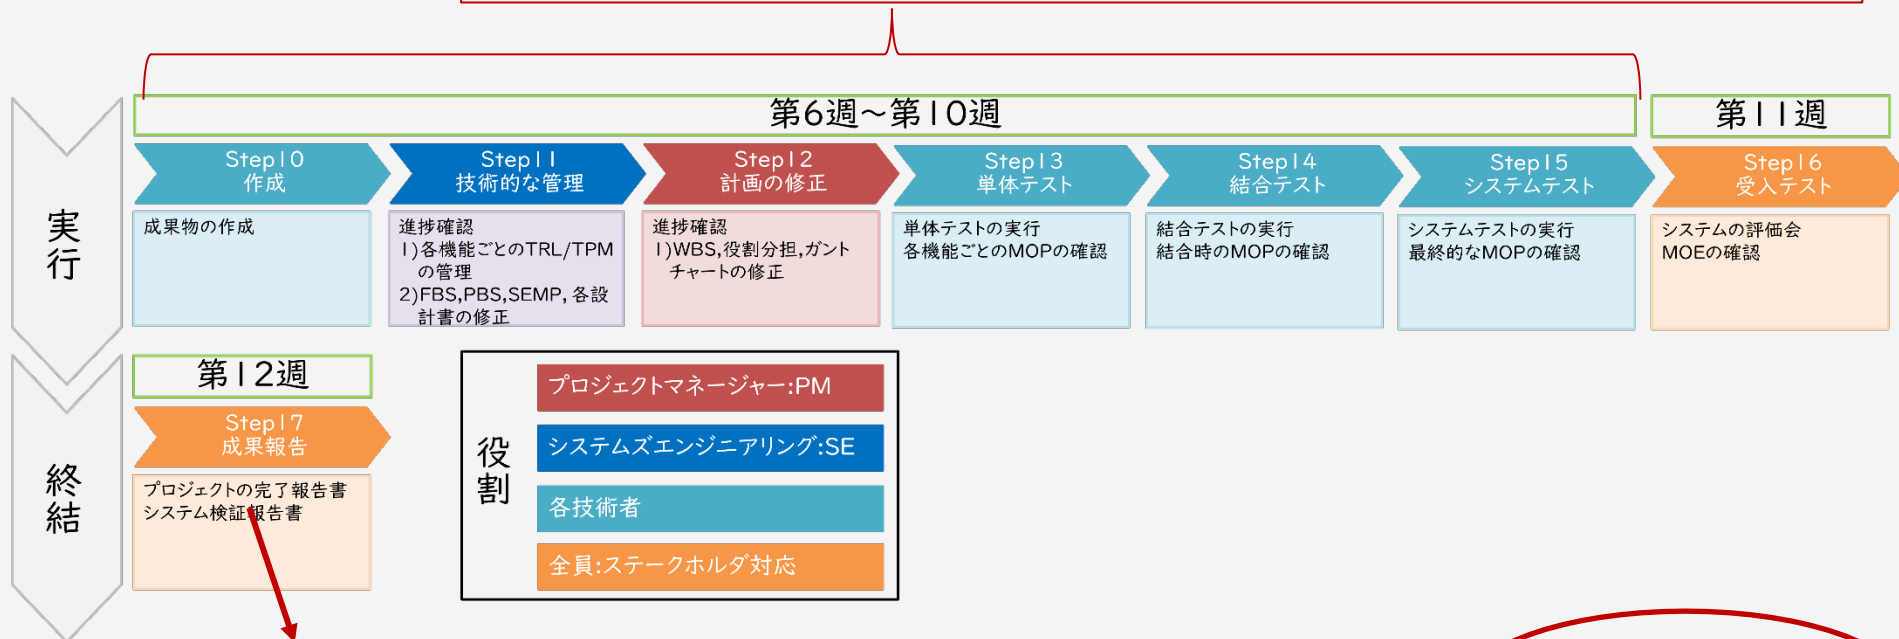

2. プロジェクトを管理した結果について報告書で提出!
※ 作成したシステムの技術的な報告書ではない!!

何をデータ化する?

- ・ 毎週の作業ログからプロジェクトの管理状況をデータ化
- ・ データとテスト結果からプロジェクトを客観的に考察して報告

1. 計画の変更履歴

- ・ FBS, PBS, WBS, 役割分担, 設計書, テスト項目, スケジュールの追加/削除/修正
- ・ いつ, なぜ, 変更したのかを記録

2. 人員毎の作業時間の統計

	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
佐波	30.5	23	29.5	30	31	36
有本	29	27	34	35	37	36
白木	30	33	32	31	29	32
関根	25	22	30	27	26	27

3. WBSの要素ごとの作業時間の統計

	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
作業A	10	12	5			
作業B			7	15	25	30
作業C	15	16	22	13	5	

4. 作業の進捗率: WBSとガントチャート

	担当	作業 達成率	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	1	2	3	4	5	6	7	8
作業A	佐波	80%																			
作業B	有本	30%																			
作業C	白木	70%																			
作業D	白木	0%																			

5. 技術成熟度レベルTRLの推移

	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
機能A	1	2	3	3	4	4
機能B	1	2	2	3	4	4
機能C	1	1	2	2	3	4
機能D	1	1	1	2	3	4

6. 技術性能指標TPMの推移

	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
機能A[°C]	±10.5	±8.5	±8.5	±6	±5	±3.5
機能B[s]	22	19	1.4	1.2	1.2	0.9
機能C[Hz]	400	410	420	430	435	441


 必要に応じてグラフも!

7. 単体/結合テスト/システムテストの実施日と結果

ID	新/再	テスト項目	テスト内容	実施日	結果	コメント
1001	新	環境温度取得	実環境における温度センサの確認。 標準的な温度計との誤差が12時間で±1度以内。	5/10	NG	1週間後 再テスト
1001	再	環境温度取得	実環境における温度センサの確認。 標準的な温度計との誤差が12時間で±1度以内。	5/17	OK	±0.5度
1002	新	音声マイク入力	マイク入力からフィルタ機能により音声の周波数 帯域(100Hz~5KHz)以外の17kHz以下の雑音が -10dB軽減されているかFFT Analyzerで確認。 sinスイープにてフィルタの有無による違いを見る。	5/24	OK	

7. 単体/結合テスト/システムテストの実施日と結果

ID	新/再	テスト項目	テスト内容	実施日	結果	コメント
1001	新	環境温度取得	実環境における温度センサの確認。 標準的な温度計との誤差が12時間で±1度以内。	5/10	NG	1週間後 再テスト
1001	再	環境温度取得	実環境における温度センサの確認。 標準的な温度計との誤差が12時間で±1度以内。	5/17	OK	±0.5度
1002	新	音声マイク入力	マイク入力からフィルタ機能により音声の周波数 帯域(100Hz~5KHz)以外の17kHz以下の雑音が -10dB軽減されているかFFT Analyzerで確認。 sinスイープにてフィルタの有無による違いを見る。	5/24	OK	



プロジェクトのデータをもとに
プロジェクトの完了報告書を記述

事前の個人課題(水曜9時):
作業ログを提出



講義(水曜12時~16時):
1) 作業ログと会話を元にプロジェクトのデータを追記
2) 問題点や作業遅れの解消, 作業負担の分散を検討
3) 計画書・設計書の変更点を議論



事後のチーム課題(水曜23時55分):
講義中の議論の議事録(メモ)を提出 ※忘れないようにするためのメモ書き



事後のチーム課題(金曜23時55分):
議論内容&議事録を元に水曜日までの内容でチームの開発ログを提出:
1) 計画書・設計書の修正
2) プロジェクトの各データ



チームの課題は交代して協力しながら実施
